國際學生宿舍

- 設計監造：潘冀聯合建築師事務所
- 承造廠商：春原營造股份有限公司
- 建築基地面積741.8坪
- 總樓地板面積8,708坪
- 地上14層樓，地下3樓
- 996床(學生床位)
- 48床(學人校友會館)
- 機車500格，汽車120格
- 工程期44個月
- 工期：111年6月28日~115年2月28日
- 工程費用：15億5,000萬元
- 設計監造費用：5,175萬元

◇高醫大國際學生宿舍工程進度里程碑

新增細部進度說明欄及裝修工程區分階段及顏色區塊

結構工程進度

RF 結構	預計完成 114/06/05	預計進度 65.66%	實際完成 / /	實際進度 %
14F 結構	預計完成 114/04/06	預計進度 56.80%	實際完成 / /	實際進度 %
13F 結構	預計完成 114/03/07	預計進度 52.37%	實際完成 / /	實際進度 %
12F 結構	預計完成 114/02/05	預計進度 46.94%	實際完成 / /	實際進度 %
11F 結構	預計完成 114/01/06	預計進度 42.98%	實際完成 / /	實際進度 %
10F 結構	預計完成 113/12/07	預計進度 39.53%	實際完成 / /	實際進度 %
9F 結構	預計完成 113/11/07	預計進度 36.60%	實際完成 / /	實際進度 %
8F 結構	預計完成 113/10/08	預計進度 33.67%	實際完成 / /	實際進度 %
7F 結構	預計完成 113/09/08	預計進度 30.78%	實際完成 / /	實際進度 %
6F 結構	預計完成 113/08/09	預計進度 28.93%	實際完成 / /	實際進度 %
5F 結構	預計完成 113/07/10	預計進度 27.52%	實際完成 / /	實際進度 %
4F 結構	預計完成 113/06/10	預計進度 26.59%	實際完成 / /	實際進度 %
3F 結構	預計完成 113/05/11	預計進度 24.40%	實際完成 / /	實際進度 %
2F 結構	預計完成 113/04/11	預計進度 21.65%	實際完成 / /	實際進度 %
1F 結構	預計完成 113/03/12	預計進度 20.31%	實際完成 / /	實際進度 %
B1F 結構	預計完成 112/10/28	預計進度 16.71%	實際完成 / /	實際進度 %
B2F 結構	預計完成 112/08/19	預計進度 14.79%	實際完成 / /	實際進度 %
B3F 結構	預計完成 112/05/29	預計進度 11.72%	實際完成 / /	實際進度 %
開挖支撐	預計完成 112/05/07	預計進度 10.12%	實際完成 / /	實際進度 %
連續壁	預計完成 112/01/23	預計進度 4.46%	實際完成 / /	實際進度 %

土方開挖及擋土支撐工程細部進度
於每週工務協調會三週進度表進行報告

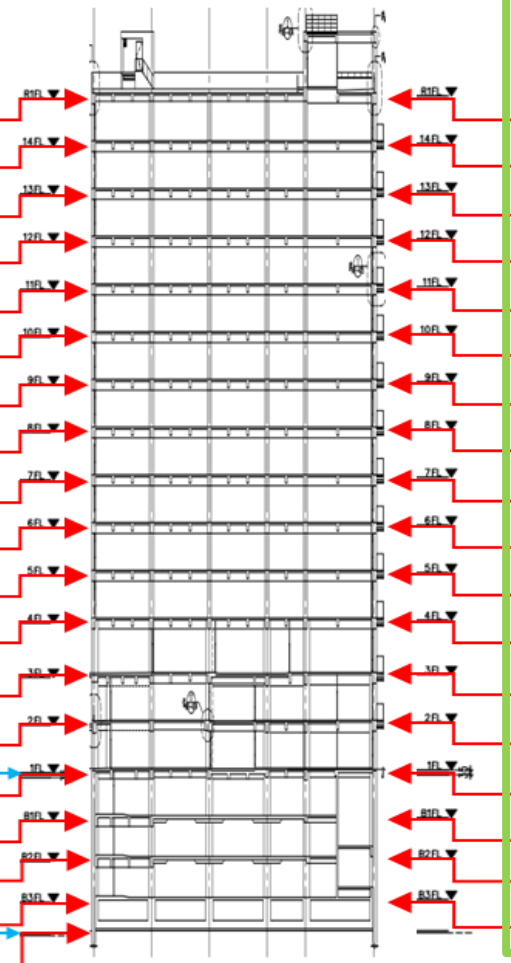

工程進度里程碑

裝修工程進度

實際進度 %	實際完成 / /	預計進度 100%	預計完成 115/02/28	使照請領	第三階段
實際進度 %	實際完成 / /	預計進度 95.21%	預計完成 114/12/05	景觀工程	第三階段
實際進度 %	實際完成 / /	預計進度 95.04%	預計完成 114/12/02	消防檢測	第三階段
實際進度 %	實際完成 / /	預計進度 85.73%	預計完成 114/10/03	外牆拆架	第三階段
實際進度 %	實際完成 / /	預計進度 83.93%	預計完成 114/09/23	RF 裝修	第一階段
實際進度 %	實際完成 / /	預計進度 82.62%	預計完成 114/09/16	14F 裝修	第一階段
實際進度 %	實際完成 / /	預計進度 81.31%	預計完成 114/09/09	13F 裝修	第一階段
實際進度 %	實際完成 / /	預計進度 80.00%	預計完成 114/09/02	12F 裝修	第一階段
實際進度 %	實際完成 / /	預計進度 78.74%	預計完成 114/08/26	11F 裝修	第一階段
實際進度 %	實際完成 / /	預計進度 77.52%	預計完成 114/08/19	10F 裝修	第一階段
實際進度 %	實際完成 / /	預計進度 76.29%	預計完成 114/08/12	9F 裝修	第一階段
實際進度 %	實際完成 / /	預計進度 75.07%	預計完成 114/08/05	8F 裝修	第一階段
實際進度 %	實際完成 / /	預計進度 73.89%	預計完成 114/07/29	7F 裝修	第一階段
實際進度 %	實際完成 / /	預計進度 72.83%	預計完成 114/07/22	6F 裝修	第一階段
實際進度 %	實際完成 / /	預計進度 71.78%	預計完成 114/07/15	5F 裝修	第一階段
實際進度 %	實際完成 / /	預計進度 70.73%	預計完成 114/07/08	4F 裝修	第一階段
實際進度 %	實際完成 / /	預計進度 83.93%	預計完成 114/09/23	3F 裝修	第二階段
實際進度 %	實際完成 / /	預計進度 79.81%	預計完成 114/09/01	2F 裝修	第二階段
實際進度 %	實際完成 / /	預計進度 95.21%	預計完成 114/12/05	1F 裝修	第二階段
實際進度 %	實際完成 / /	預計進度 75.77%	預計完成 114/08/09	B1F 裝修	第二階段
實際進度 %	實際完成 / /	預計進度 71.78%	預計完成 114/07/15	B2F 裝修	第二階段
實際進度 %	實際完成 / /	預計進度 67.98%	預計完成 114/06/20	B3F 裝修	第二階段

細部裝修工程進度預計於114年04月提送
